

令和4年度 都市環境整備部 主要事業について

令和4年度 公園事業案内図

⑬上谷戸親水公園

⑥河原方第二公園

⑪もぐらさん公園

⑫白道ちびっ子広場

⑦奚疑公園

⑨本郷公園

⑧幸方公園

⑩砂見公園

⑤松葉公園

②東長沼七曲見晴児童公園

①平尾近隣公園

③平尾入定塚児童公園

④平尾谷戸公園



スプリング遊具イメージ

No.	公園名称	内 容
①	平尾近隣公園	シーソー 1基 スプリング遊具 2基
②	東長沼七曲見晴児童公園	スプリング遊具 1基
③	平尾入定塚児童公園	スプリング遊具 3基 4連ブランコ 1基
④	平尾谷戸公園	スプリング遊具 2基
⑤	松葉公園	スプリング遊具 1基
⑥	河原方第二公園	スプリング遊具 2基
⑦	奚疑公園	スプリング遊具 2基
⑧	幸方公園	スプリング遊具 2基 すべり台 1基
⑨	本郷公園	スプリング遊具 2基
⑩	砂見公園	スプリング遊具 2基
⑪	もぐらさん公園	スプリング遊具 2基
⑫	白道ちびっ子広場	スプリング遊具 3基
⑬	上谷戸親水公園	LEDランプ取替 11基

※ 遊具につきましては、令和3年度に実施いたしました「公園遊具保守点検」の結果に基づき、更新等を行うものです。

市施行土地区画整理事業


都市環境整備部 区画整理課

事業名	事業概要	進捗状況 (令和3年度末)	令和4年度 主な事業予定
稲城榎戸 土地区画整理事業	事業区域面積＝25.3ha 事業期間 平成元年～令和10年度 建物棟数 492棟 道路整備延長 7,260m 公園 4箇所 9,957㎡	建物移転棟数 442棟 (進捗率: 89.8%) 道路整備延長 6,172m	建物移転 4棟 (進捗率: 90.7%) 電線共同溝整備 420m
稲城矢野口駅周辺 土地区画整理事業	事業区域面積＝16.8ha 事業期間 平成4年度～令和8年度 建物棟数 397棟 道路整備延長 5,658m 公園・緑地 11箇所 5,629㎡	建物移転棟数 201棟 (進捗率: 50.6%) 道路整備延長 3,233m	建物移転 1棟 (進捗率: 50.9%) 道路整備 50m
稲城稲城長沼駅周辺 土地区画整理事業	事業区域面積＝10.6ha 事業期間 平成5年度～令和12年度 建物棟数 274棟 道路整備延長 3,790m 公園 3箇所 3,600㎡	建物移転棟数 138棟 (進捗率: 50.4%) 道路整備延長 1,738m	建物移転 4棟 (進捗率: 51.8%) 道路整備 41m
稲城南多摩駅周辺 土地区画整理事業	事業区域面積＝12.2ha 事業期間 平成4年度～令和10年度 建物棟数 239棟 道路整備延長 2,906m 公園・緑地 8箇所 3,932㎡	建物移転棟数 182棟 (進捗率: 76.2%) 道路整備延長 1,513m	建物移転 1棟 (進捗率: 76.6%) 電線共同溝整備 1式 (連系管)

令和4年度事業計画【榎戸地区】

稲城榎戸土地区画整理事業概要

- | | |
|--------------|--------|
| ① 施行面積： | 25.3ha |
| ② 建物要移転棟数： | 492棟 |
| ③ 公共施設： | |
| ・都市計画道路4路線 | 1,766m |
| ・区画道路 | 5,494m |
| ・公園4か所 | 9,957㎡ |
| ④ 令和4年度の整備予定 | |
| ・建物移転棟数 | 4棟 |
| ・電線共同溝整備 | 420m |
| ・区画道路築造工事 | 36m |
| ・その他工事 | 1式 |

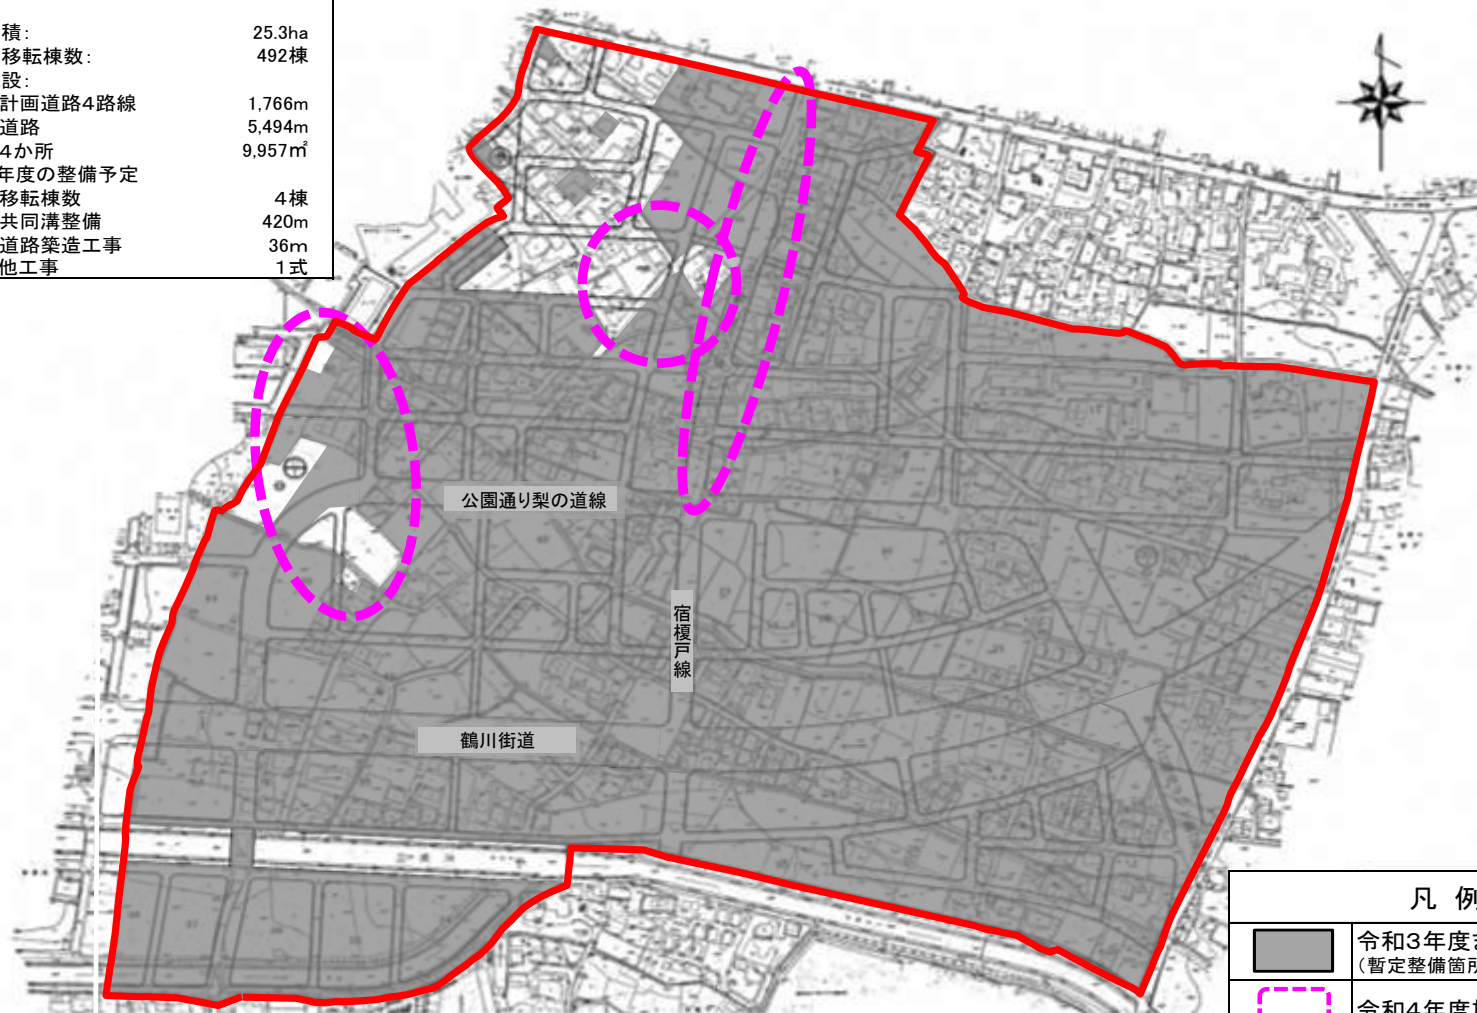

0 50 100 150 200


凡 例

	令和3年度までの完了箇所 (暫定整備箇所を含む。)
	令和4年度施行予定箇所
	事業区域

令和4年度事業計画【矢野口駅周辺地区】

稲城矢野口駅周辺土地区画整理事業概要


- | | |
|--------------|--------|
| ① 施行面積: | 16.8ha |
| ② 建物要移転棟数: | 397棟 |
| ③ 公共施設: | |
| ・都市計画道路7路線 | 1,393m |
| ・区画道路 | 4,265m |
| ・公園4か所・緑地7か所 | 5,629㎡ |
| ④ 令和4年度の整備予定 | |
| ・建物移転棟数 | 1棟 |
| ・区画道路築造工事 | 50m |
| ・その他工事 | 1式 |

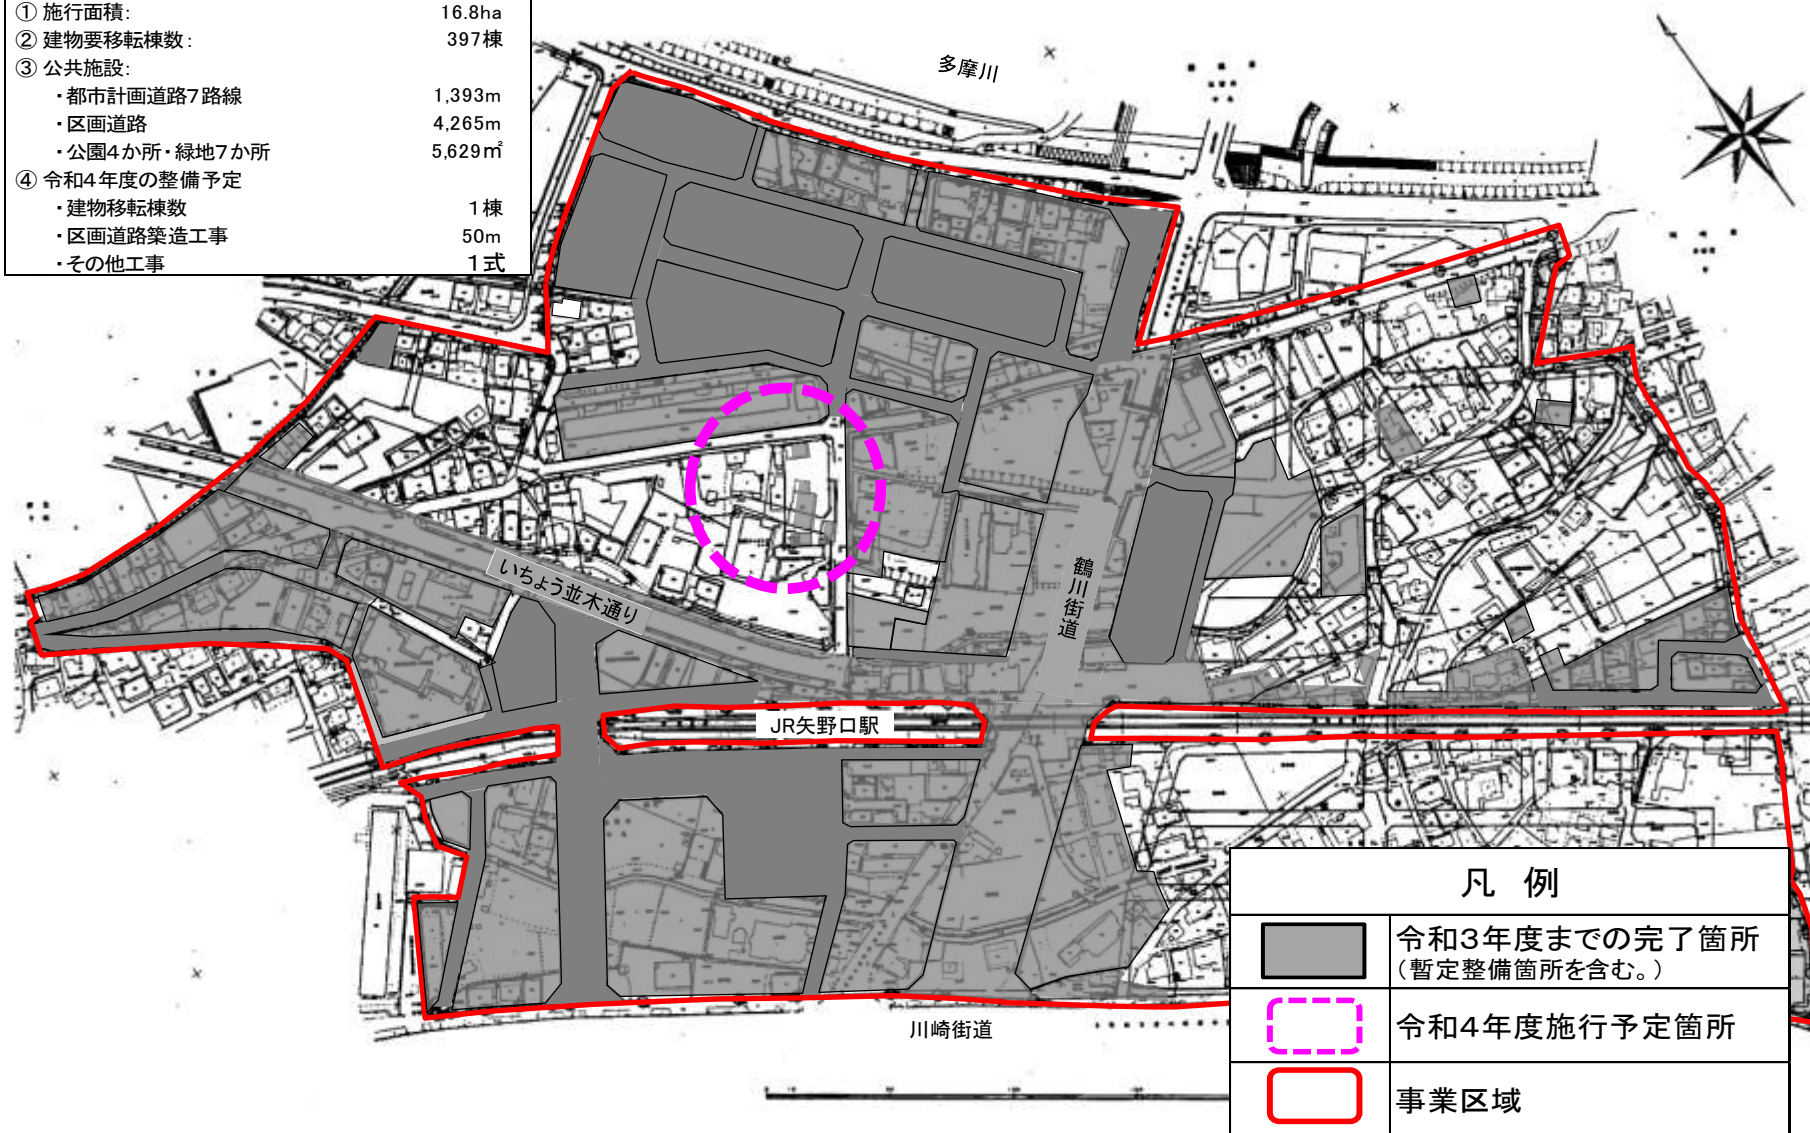


凡 例

	令和3年度までの完了箇所 (暫定整備箇所を含む。)
	令和4年度施行予定箇所
	事業区域

令和4年度事業計画【稲城長沼駅周辺地区】

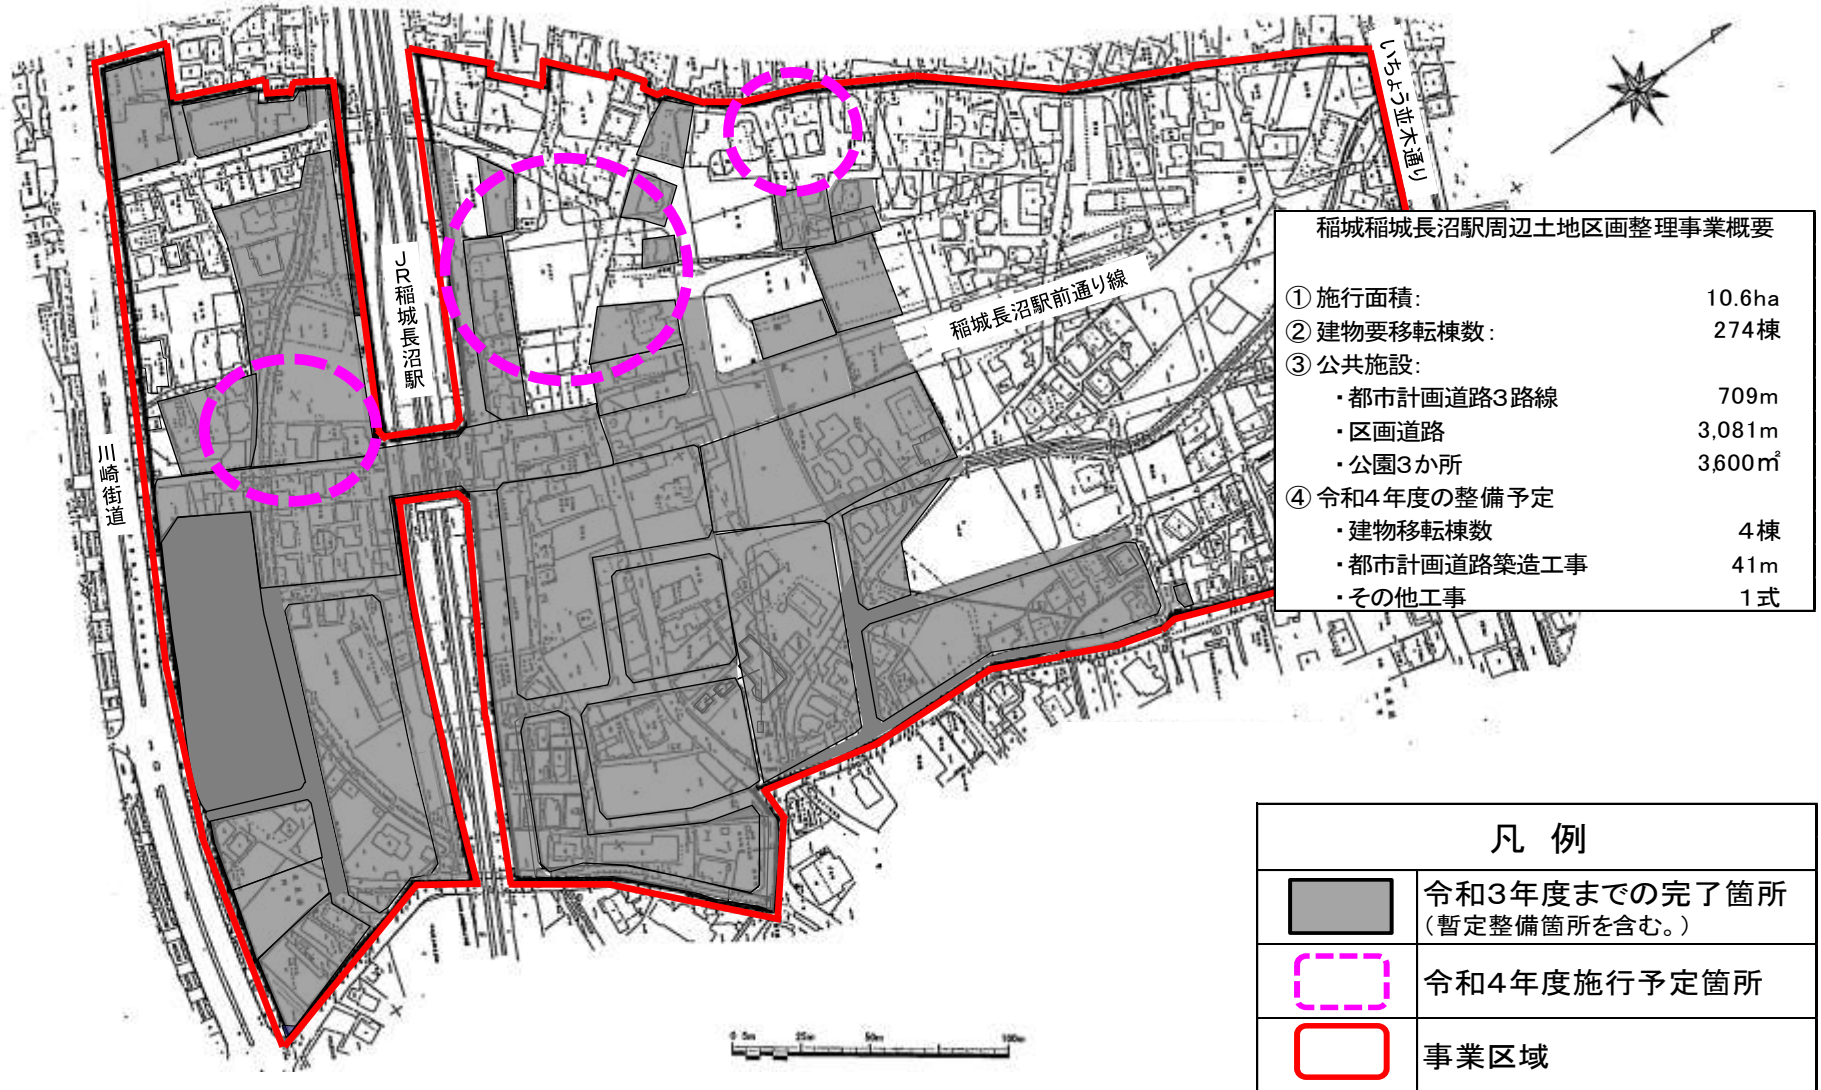

令和4年度事業計画【南多摩駅周辺地区】

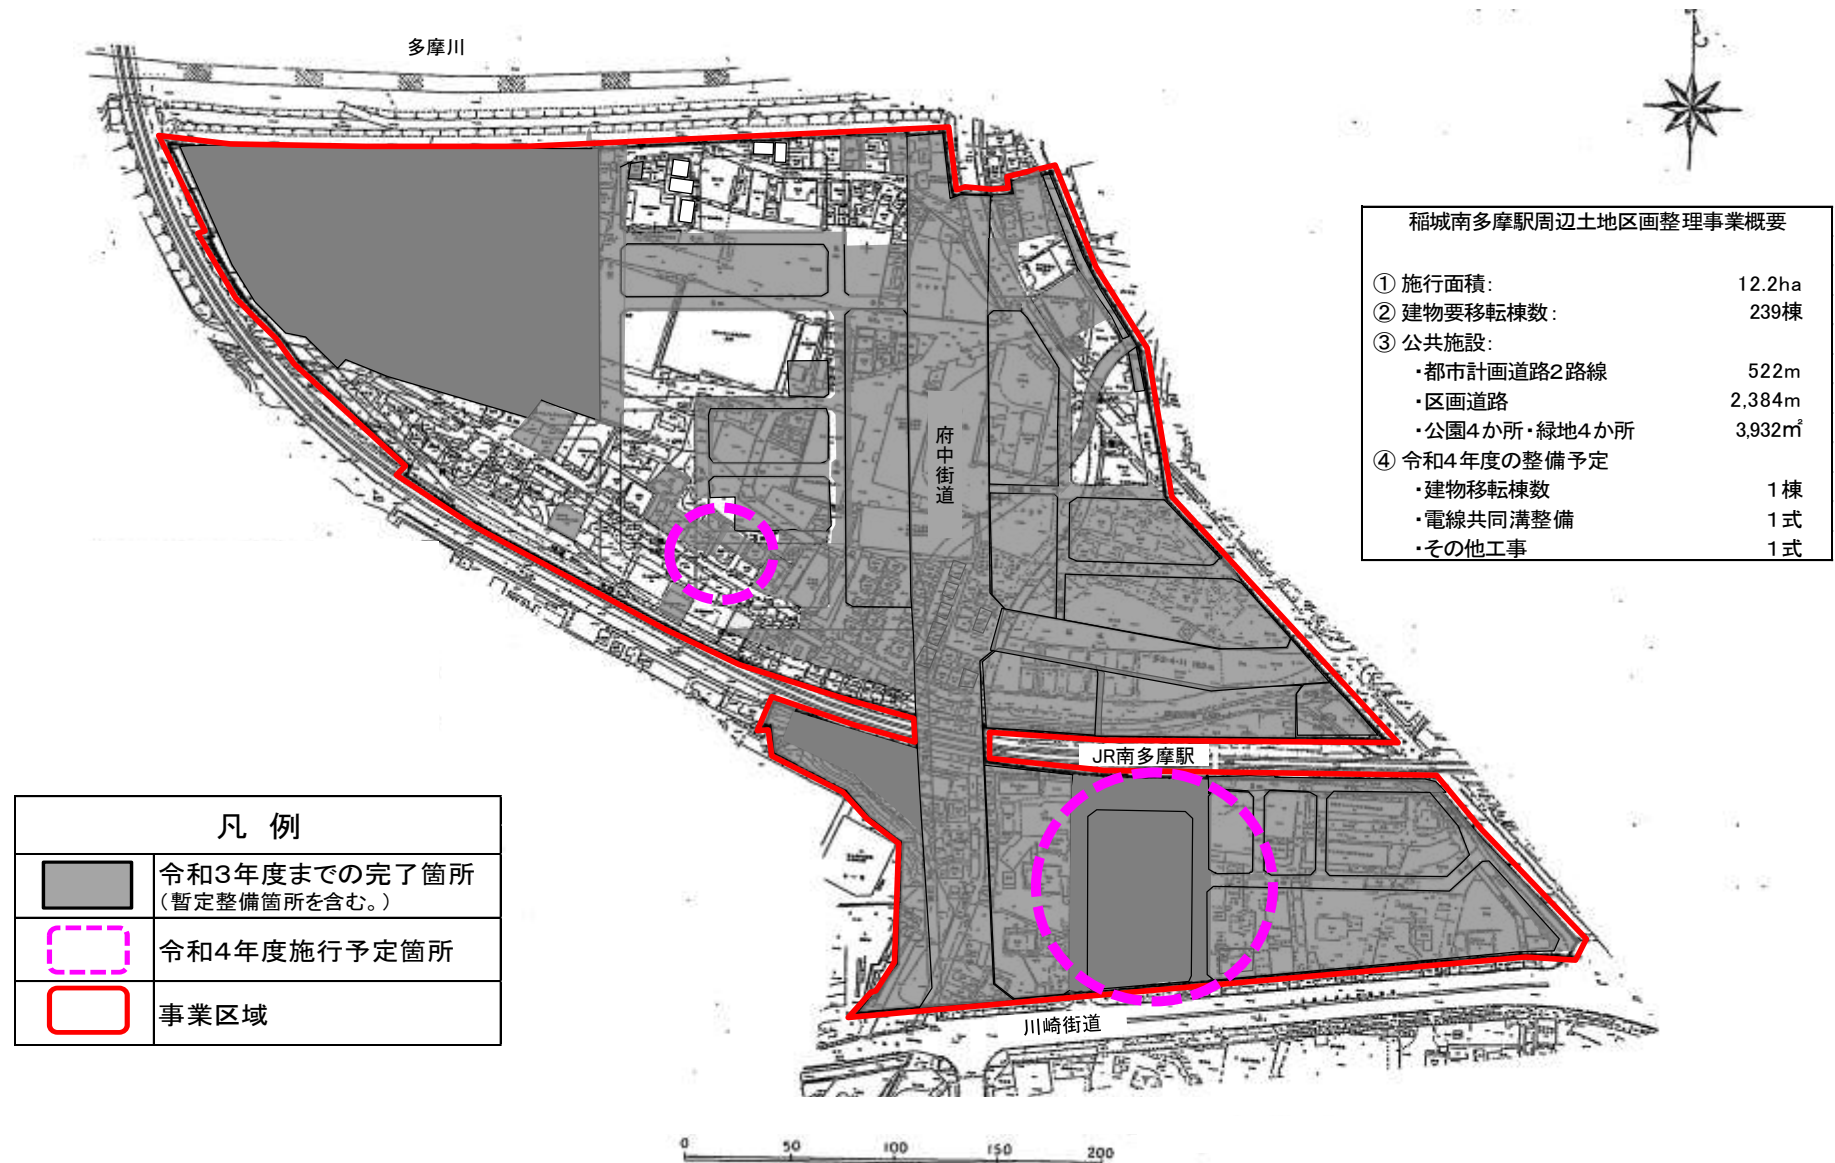


組合施行土地区画整理事業

都市環境整備部 区画整理課

事業名	事業概要	進捗状況 (令和3年度末)	令和4年度 主な事業予定
多摩都市計画事業 稲城南山東部 土地区画整理事業	施行面積：約 87.5ha 事業期間：平成18年4月12日 ～令和7年3月31日 権利者数：291人 合算減歩率：68.16% 事業費：約 576億円	進捗率 (市補助金ベース) 80.3% (使用収益開始面積ベース) 39.8%	・造成工事 ・道路築造工事 ・供給処理施設工事 ・ランド谷戸等盛土工事 ・保留地処分等 進捗率(予定) (市補助金ベース) 87.7% (使用収益開始面積ベース) 55.8%

- ・稲城小田良土地区画整理事業につきましては、令和5年3月頃の換地処分に向けて作業中。

多摩都市計画事業 稲城南山東部土地区画整理事業 令和4年度 事業

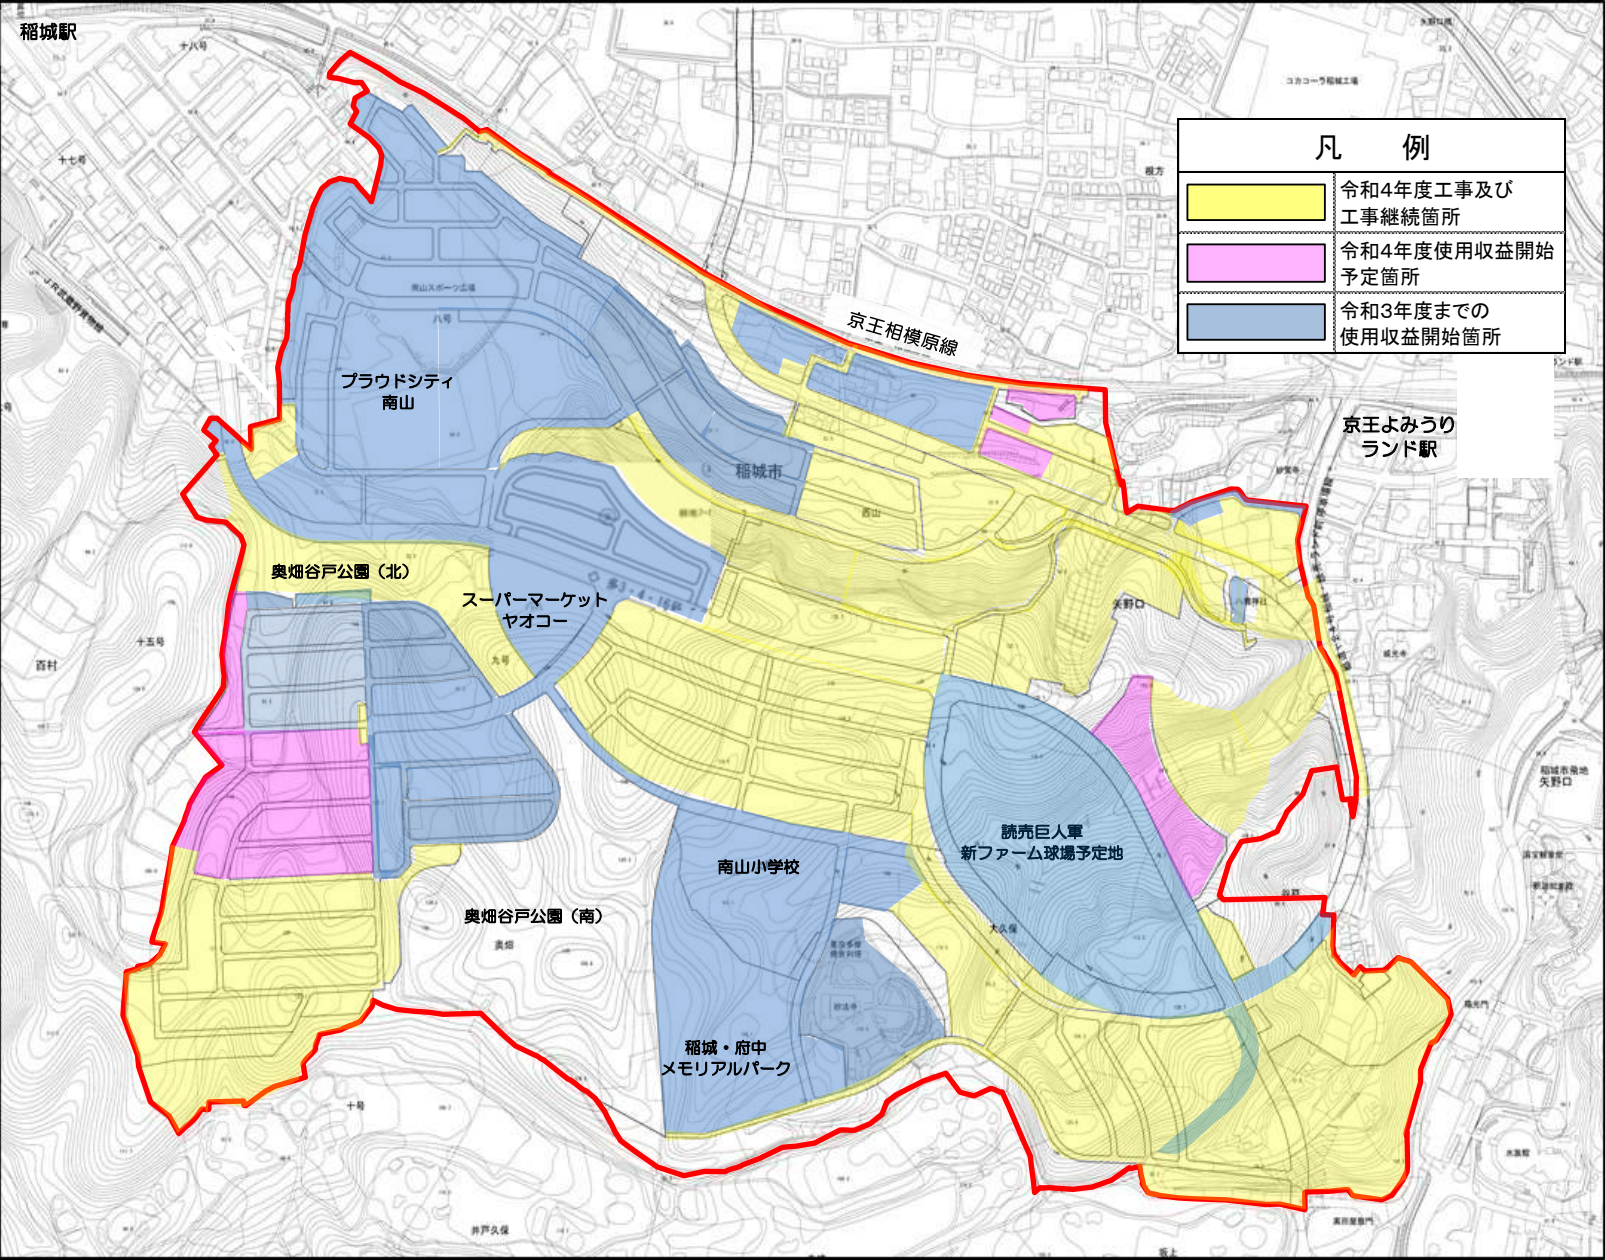

令和4年度 事業概要

1. 造成工事
2. 道路築造工事
3. 供給処理施設工事
4. ランド谷戸等盛土工事
5. 使用収益開始・保留地処分

下水道事業

都市環境整備部下水道課

番号	事業名	事業概要	場所（関連事業）	実施予定時期
(東長沼・矢野口地区)				
①	南山東部土地区画整理事業地内 污水管及び雨水管整備工事	污水管・雨水管新設 φ 200～1350 L=1,952m	南山東部土地区画整理事業区域内	令和4年8月 ～ 令和5年2月
(矢野口地区)				
②	多3・4・12号読売ランド線 污水管整備工事(その2)	污水管新設及び撤去 φ 250～600 L=114m	多3・4・12号読売ランド線受託 事業	令和4年9月 ～ 令和4年12月

※ 市内全体の整備進捗率(整備済面積/下水道事業認可面積):約92%[R3年度末]

※ 普及率(供用開始可能世帯数/全世帯数):約99.3%[R4.3.1現在]

☆ 事業名、工事内容及び実施時期等につきましては、関連事業・関係機関・地元関係者等との調整により、変更となる場合があります。

☆ この表以外にも、応急工事や補修工事等を実施する場合があります。

令和4年度 下水道課工事予定箇所案内図

